Projektnummer: 2321

Bauzeitenplan

Energetische Sanierung Schwimmbadgebäude

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	Gerüststellung	5at	Mo, 24.06.24	Fr, 28.06.24
2	Demontage Heizkörper+Sitzbank	3at	Mi, 26.06.24	Fr, 28.06.24
3	Metallbau+Verglasung (Pfostenriegelfassade)	10at	Mo, 01.07.24	Fr, 12.07.24
4	Metallfenster Demontage und neu einbauen	10at	Mo, 01.07.24	Fr, 12.07.24
5	Wandfliesen Demontage + neu fliesen	10at	Mo, 01.07.24	Fr, 12.07.24
6	Demontage Estrich + Fliesen	3at	Mi, 03.07.24	Fr, 05.07.24
7	Sitzbank mauern	5at	Mo, 15.07.24	Fr, 19.07.24
8	Sitzbank fliesen mit Sitzheizung	8at	Mi, 17.07.24	Fr, 26.07.24
9	Türen Demontage und neu einbauen	5at	Mo, 15.07.24	Fr, 19.07.24
10	Malerarbeiten	5at	Mo, 22.07.24	Fr, 26.07.24
11	Abbruch- u. Zimmerarbeiten	25at	Mo, 01.07.24	Fr, 02.08.24
12	Dachdeckungs- u. Klempnerarbeiten	25at	Mo, 15.07.24	Fr, 16.08.24

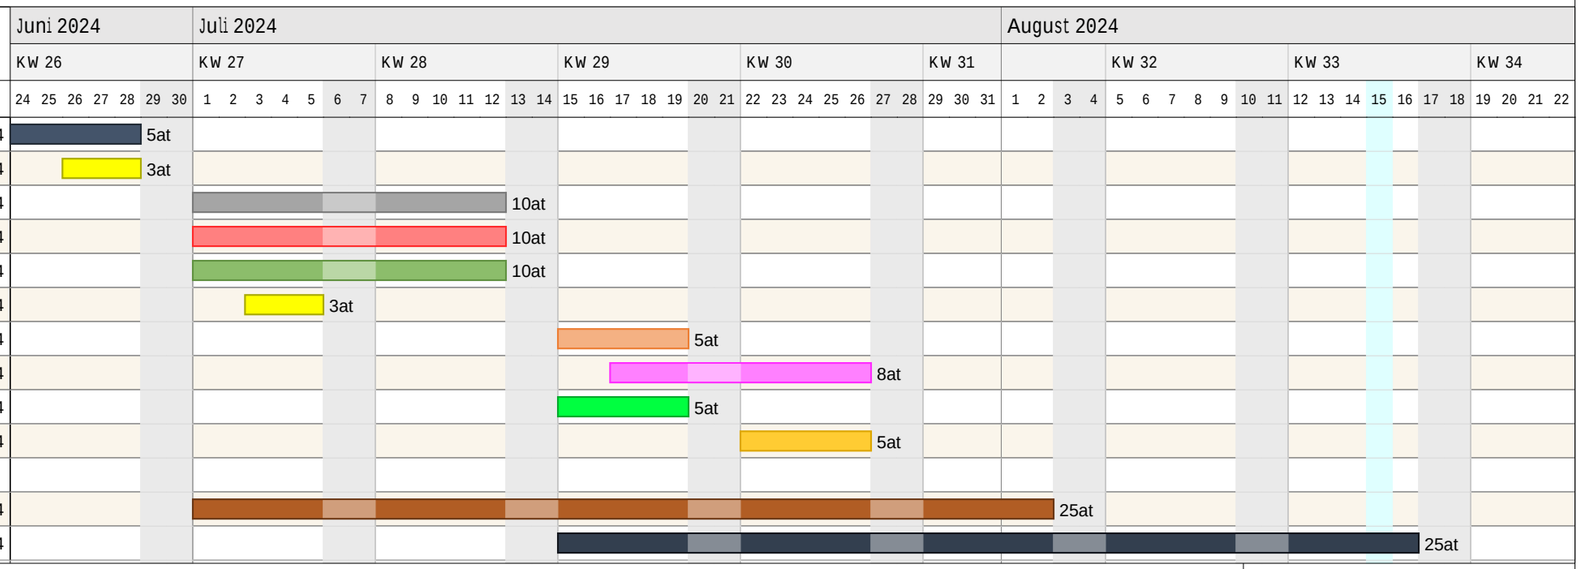

Projektzeitrahmen von Mo, 24.06.24 bis Sa, 24.08.24
Kalender: Baden-Württemberg (eingebettet)
Druckdatum: 26.04.2024 10:10
Filter:
Bearbeiter:

Architektur + Stadtplanung GbR
Dipl.-Ing. A.Thoma - J.Sauer Architekten
Hüflischer Hof 13
D-77815 Bühl
Tel. 07223-9382-0
Fax 07223-9382-11
e-Mail: a.thoma@architekturbuero-as.de

erstellt mit proPlan 6 (6.0.0.48) Seriennr.: 2836 Lizenz für as Architektur + Stadtplanung Bühl
